

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch fabrycznie nowych kontenerów modułowych oraz zewnętrznych pryszniców we wskazanym miejscu wraz z wykonaniem fundamentów do posadowienia kontenerów.

Kontener dla ratowników powinien spełniać funkcję magazynową, toalety z prysznicem, pomieszczenia biurowego dla ratowników oraz punktu zasilania elektrycznego.

Kontener sanitarny – przebieralnia powinien zapewnić osobom korzystającym z kąpieliska na swobodny dostęp do toalet i kabin. Podzielony na dwie części: damska i męska. W damskiej części powinny się znajdować dwie toalety zamknięte i trzy kabiny do przebierania, w męskiej części powinna się znajdować jedna toaleta zamknięta oraz pisuar wolnostojący i trzy kabiny do przebierania. Dodatkowo w obu częściach dostępne umywalki.

Prysznice zewnętrzne 1 komplet tj. 3 sztuki (stanowisk) ogólnodostępne usytuowane przy ścianie jednego z kontenerów.

Proponowana przybliżona powierzchnia poszczególnych pomieszczeń:

Kontener dla ratowników

magazyn sprzętu	4x2 – 8m ²
ubikacja	2x2 – 4m ²
pomieszczenie biurowe z aneksem kuchennym –	6x2,5 – 15m ²

Przykładowe wymiary to: 601 cm x 580 cm. Razem do **35 m²**

Kontener sanitarny – przebieralnia


Część damska	6x2,5 – 15m ²
Część męska	6x2,5 – 15m ²

Przykładowe wymiary to: 601 cm x 580 cm. Razem do **35 m²**

Prysznice zewnętrzne

Trzy stanowiska na obszarze 1,2x3,5 – 4,2m²

Przykładowy rozkład pomieszczeń kontenerów przedstawia szkic poniżej.

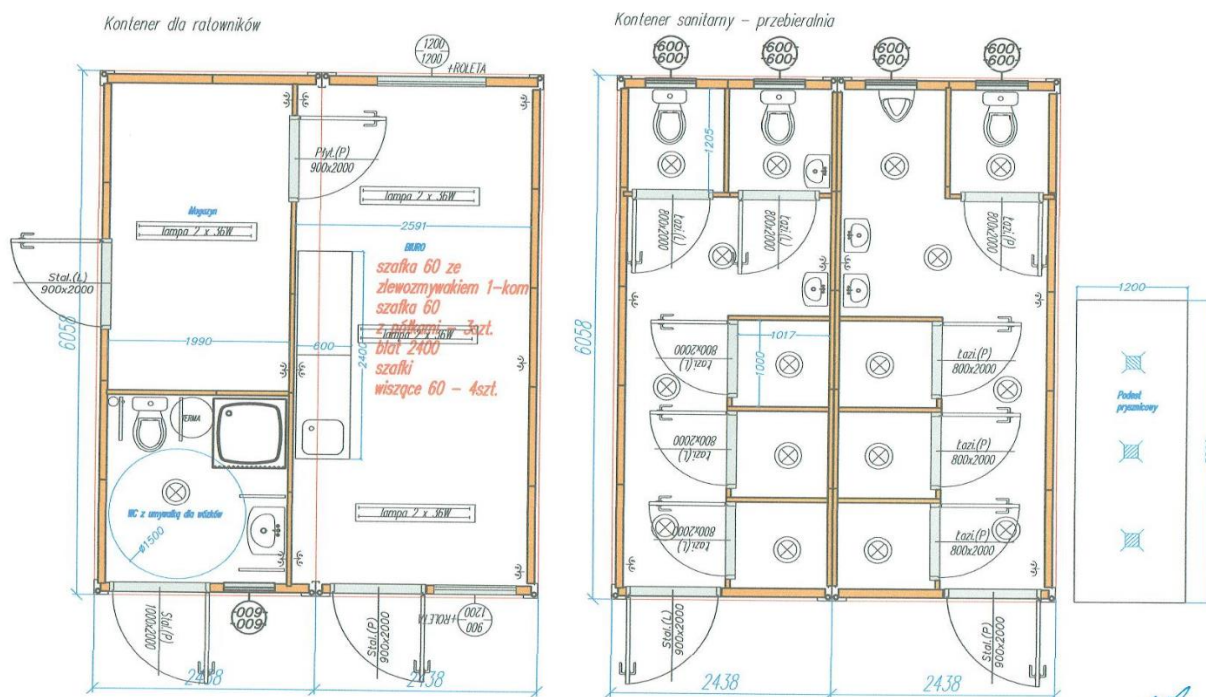

Ściany kontenerów, powinny być izolowane przed nadmiernym nagraniem w jasnych kolorach. Na ścianie altanki powinno być od zewnątrz umieszczone logo (szt. 2) Budżetu Obywatelskiego w formacie A2 lub zbliżonym (wzór logo stanowi odrębny załącznik). Wszystkie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalację elektryczną oświetleniową. W kontenerze dla ratowników w pomieszczeniu biurowym co najmniej dwa podwójne gniazdka elektryczne. Toaleta z dostępem dla niepełnosprawnych. Opcja: drzwi wejściowe do toalet w obu kontenerach z możliwością sterowania elektrycznego. Wyposażenie toalet standardowe, w kontenerze dla ratowników dodatkowo prysznic w ciepłą wodą. Kran w umywalkach w toaletach z dozownikiem wody, z odcięciem po wydaniu 1-2 l wody. Kolorystyka kontenerów stonowana. Kontener sanitarny – przebieralnie, wyposażony w trzy toalety i pisuar oraz cztery umywalki, sześć przebieralni, wg szkicu powyżej. Kran w umywalkach w toaletach z dozownikiem wody, z odcięciem po wydaniu 1-2 l wody. 3 natryski prysznicowe, zewnętrzne, wolnostojące, oddalone od kontenera (2-3 m.), bez odpływów. Instalacja wodna prowadzona z kontenera przebieralni (pod ziemią). Prysznic z dozownikiem wody, z odcięciem po wdaniu 2-3 l. wody.

Uzbrojenie: zasilanie 3x400 V, 25A, oświetlenie elektryczne, woda, kanalizacja (odprowadzanie do szamba). Na ścianie kontenera na wysokości około 50 cm gniazdo siłowe 3p+N+E 32A (ochrona IP67), z zasilaniem włączanym od wewnątrz, szczegóły do uzgodnienia. Położenie kontenerów – zaznaczenie kolorem brązowym na załączniku graficznym (poniżej): Przewiduje się lokalizację

kontenerów na działce 146/2, obręb Malina, przy północno-wschodniej granicy działki, w odległości ok. 50 m od ulicy Olimpijskiej, na wcześniej przygotowanym podłożu, zgodnie ze wskazówkami dostawcy.

Układ fundamentów do posadowienia kontenera stanowi odrębny załącznik.

UWAGA:

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie, celem opracowania kompleksowej oferty cenowej przedmiotu zamówienia.

Telefony kontaktowe:

Włodzimierz Leski – Dział Techniczny MOSiR, tel. (77) 454 32 66 wew. 137

Poniżej schematyczna lokalizacja kontenera w terenie.

